


Tambo 003622 RI

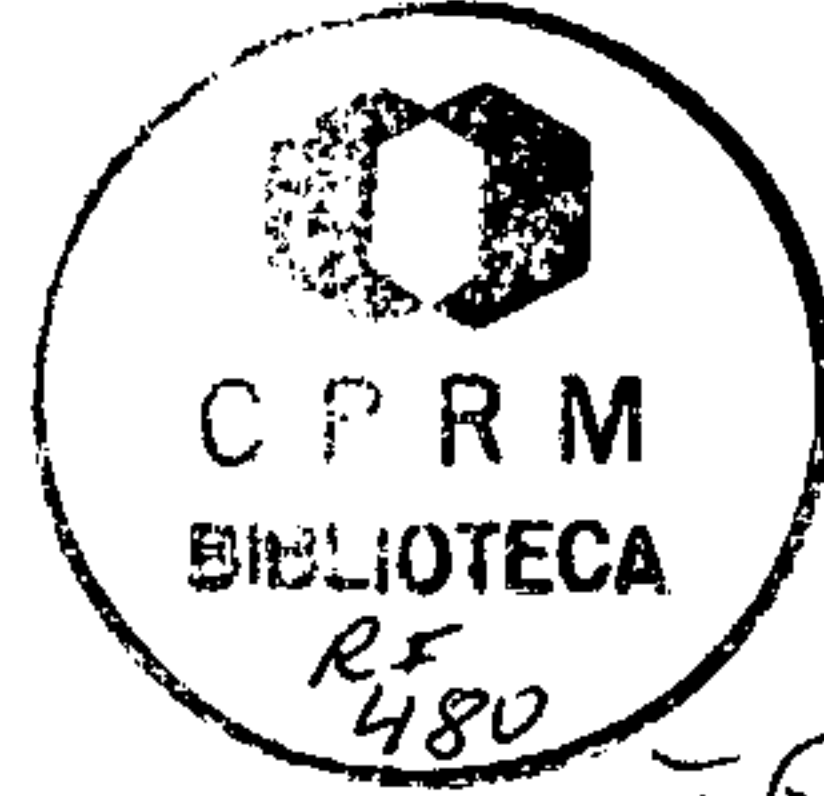

199
F. 2004

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELÉM
DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS - DEPES
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MINERAL
EM MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA - PRIMAZ
RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL/1995

PRIMAZ - RELATÓRIO ANUAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o ano de 1995 nossas expectativas frente ao montante de trabalhos programados foram superadas.

Ao final de 1994 as programações do PRIMAZ para 1995 incluíam os municípios de Santa Maria das Barreiras, Pau D'Arco, Santana do Araguaia e Cumaru do Norte.

Desses municípios, o único em que não houve nenhuma incursão foi Cumaru do Norte, apesar do mesmo já ter sido visitado em fins de 1993.

Durante o período, foram trabalhados os municípios de Santa Maria das Barreiras, Pau D'Arco, Santana do Araguaia e Marabá. Além do que, trabalhos de pedologia, aptidão agrícola e inventário florestal foram desenvolvidos em Redenção, Conceição do Araguaia e Marabá.

Afora isso, houve neste ano de 1995, o início das operações de campo da Frente Sudoeste, incluindo os municípios de Itaituba, Jacareacanga, seguido do município de Santarém.

O início da frente sudoeste coincidiu com a abertura dos trabalhos do Programa de Levantamentos Geológicos de Jazimentos de Ouro Primário na bacia do Rio Tapajós.

Essa feliz coincidência provocou uma mudança no programa do PRIMAZ, para o município de Itaituba, quando então houve a necessidade de se elaborar mapas abrangentes, incluindo o Programa Aurífero do Tapajós; nesse caso alcançando todo o antigo município de Itaituba, que abrange hoje, os municípios de Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga.

FRENTE SUDESTE

No início do ano de 1995 havia sido concluído o relatório final do Município de Santa Maria das Barreiras, o qual foi entregue solenemente na Câmara Municipal e Prefeitura em junho de 1995.

Concomitante a esse relatório foram realizados levantamentos de campo no Município de Pau D'Arco, com o relatório final entregue no mês de novembro de 1995.

Atualmente está-se ultimando a itemização multidisciplinar do relatório final do Município de Santana do Araguaia.

A não conclusão desse relatório em 1995 deveu-se a diversos fatores entre os quais, a falta de detalhamento geológico/geofísico ao longo de diversas formações mapeadas, sem um estudo preciso dos mesmos e a criação de mais um tema relativo ao estudo da qualidade das

águas superficiais. Esse último tema é o que mais atraso sofreu na sua elaboração foi o causador da não entrega do relatório em fins de 1995.

FRENTE SUDOESTE

Os trabalhos nessa frente culminaram com o levantamento de dados e elaboração do relatório final do município de Itaituba. Juntamente com esse trabalho, foi arregimentada uma equipe de técnicos da CPRM, SUREG-BE e outras SUREGs, para a realização do trabalho preliminar de levantamento dos jazimentos auríferos primários da região da Província Aurífera do Tapajós.

Esse trabalho tem por objetivo dar ciência às empresas de mineração que possam vir a instalar-se na Amazônia, após a abertura ao capital internacional, às melhores opções de investimento em pesquisa mineral e quicá, ocorrências pesquisadas.

Esse programa foi concebido durante a reunião de Miami, entre técnicos de diversos países e sobretudo da América Latina, objetivando as diversas possibilidades de desenvolvimento no setor mineral. No caso do Brasil especificamente, preconizando a abertura ao capital multinacional.

Esse fato resultou em relatório à parte, elaborado e explanado durante a abertura do Programa de Levantamentos de Jazimentos Auríferos Primários da Província Aurífera do Tapajós.

O relatório sobre o Município de Itaituba foi concluído e entregue oficialmente no dia 05.10.95, em cerimônia oficial na Câmara Municipal de Itaituba, onde compareceram o Secretário do Ministério de Minas e Energia, o presidente da CPRM e outras autoridades federais, estaduais e municipais.

CONVÊNIO DE DESEMPENHO

Para as duas frentes de serviço, sudeste e sudoeste, estavam programados e compromissados um total de 28 mapas temáticos, inseridos nos diversos relatórios dos municípios estudados.

Foram entregues ao longo do ano, no 1º trimestre, 8 (oito) mapas temáticos, do Município de Santa Maria das Barreiras. No 2º trimestre, foram entregues 8 (oito) mapas temáticos do Município de Pau d'Arco e 3 (três) mapas do Município de Itaituba. No 3º trimestre, foram concluídos 2 (dois) mapas temáticos (solos e aptidão agrícola), do Município de Redenção e 7 (sete) mapas temáticos do Município de Itaituba.

Com a elaboração desses mapas, havíamos completado o total compromissado com o Convênio de Desempenho que eram de 28 (vinte e oito) mapas.. Contudo, ainda no 4º trimestre foram concluídos e apresentados mais 04 (quatro) temas do Município de Itaituba.

Haveríamos de apresentar ainda mais temas, ultrapassando em muito o total conveniado, se não tivesse havido contratempos na entrega do relatório de Santana do Araguaia. Contudo,

pretendemos apresentar esse relatório com 09 (nove) mapas temáticos nos primeiros dias de janeiro de 1996.

PROGRAMAÇÃO PARA O PRÓXIMO ANO

Para o próximo ano de 1996, estão programados os seguintes trabalhos:

FRENTE SUDESTE

Município de Santana do Araguaia - conclusão de relatório final em princípio de janeiro.

Município de Marabá - retorno ao campo em início de fevereiro para concluir o levantamento dos recursos minerais, cheques em campo de geofísica, de levantamento geológico/geofísico para determinação de aquíferos, além de continuação do levantamento sócio-econômico.

Em seguida, início dos trabalhos nos municípios de Parauapebas, Curionópolis e Itupiranga.

FRENTE SUDOESTE

Continuação dos trabalhos nos municípios de Jacareacanga, Itaituba (II Etapa) e Santarém, já iniciados neste ano de 1995.

Início dos trabalhos nos municípios de Monte Alegre e Altamira.

FRENTE NORDESTE

Início das operações de levantamento sócio-econômico e mineral dos municípios de Vizeu e Bragança.

FRENTE AMAPÁ

Início das operações de campo, com levantamento geológico de ocorrências minerais, bem como, busca de dados sócio-econômicos nos municípios de Calçoene e Laranjal do Jari.

COMENTÁRIOS

Salienta-se a necessidade de demonstração de gastos orçamentários das duas frentes de serviços: SUDESTE e SUDOESTE, assim como das outras frentes, quando as mesmas estiverem em operação.

Maior responsabilidade dos técnicos engajados no projeto com relação a conclusão de suas tarefas dentro de uma previsão razoável de tempo, afim de não alterar o cronograma do projeto.

Para o aprimoramento de nossas programações, necessitamos de um maior número de desenhistas cartógrafos e digitadores para operacionalizar com rapidez os relatórios.

DRM/DEPES
ATIVIDADES DE 1995

UNIDADE REGIONAL : SUREG-BE

PROJETO : PRIMAZ

FRENTE SUDESTE

MÊS	PERÍODO DE CAMPO (EM GEÓLOGO/DIA)	
	PERMANÊNCIA TOTAL	TRABALHO EFETIVO
Janeiro		
Fevereiro		
Março	De 07 a 24	34
Abril		
Maio	De 03 a 31.05.95	84
Junho		
Julho	24 a 31.07.95	21
Agosto	01 a 22.08.95	66
Setembro		
Outubro		
Novembro	07 a 30.11.91	92
Dezembro	01 a 07.12.95	28
TOTAL		325

AMOSTRAS NO ANO									
	COLETADAS (TOTAL)	REMETIDAS AO LABORATÓRIO				ANALISADAS			
		Q	P	M	T	Q	P	M	T
ROCHA		60		32		60		20	
CONCENTRADO DE BATEIA									
SEDIMENTO DE CORRENTE									
TOTAL		60		32		60		20	

Q = Química/geoquímica
P = Petrografia/calvografia
M = Mineralogia de concentrado de bateia

Data : 02/01/96

Chefe do Projeto (nome) BENEDITO CARLOS DAMASCENO

Assinatura

